

# Gestion de projet

Méthode, outil, backlog, planification et organisation Git

ECF — Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile
Version 1.0 — octobre 2026
Auteur : Romain Frigolet (FastDev)

# 1. Contexte et organisation

Le projet est mené pour le compte de l'agence **FastDev**, sous la direction d'un chef de projet qui a recueilli les besoins de Julie et José (Vite & Gourmand). Je suis le développeur full-stack chargé de l'ensemble de la réalisation : analyse, maquettage, développement front-end et back-end, tests, déploiement et documentation. La durée indicative est de **70 heures**.

# 2. Méthode : agile Kanban en sprints courts

J'ai choisi une approche **agile** inspirée de Scrum et de Kanban, adaptée à un développeur seul :

- le besoin est découpé en **user stories** (« En tant que…, je veux…, afin de… ») regroupées par **epics** (cadrage, socle, front public, comptes, commande, espace client, espace employé, administration, qualité, livraison) ;
- chaque story reçoit une **priorité** (MoSCoW simplifié : haute / moyenne) et une **estimation** en heures ;
- le travail est planifié en **5 sprints** (sprint 0 de cadrage + 4 sprints de réalisation), chacun se terminant par une version testée fusionnée dans `develop` ;
- l'avancement est suivi sur un **tableau Kanban** à 4 colonnes : *À faire* → *En cours* → *En test* → *Terminé*, avec une limite d'une story « En cours » à la fois pour finir avant de commencer.

Pourquoi pas un cycle en V ? Le client n'a pas de culture informatique : livrer des incréments visibles (catalogue, puis commande, puis back-office) permet de valider au fil de l'eau et de réduire le risque de mauvaise interprétation du besoin.

## 2.1 Définition de « Terminé » (Definition of Done)

- Fonctionnalité conforme à la user story et aux règles de gestion de l'énoncé ;
- validation des données côté serveur, protections de sécurité en place (CSRF, échappement, contrôle d'accès) ;
- affichage vérifié sur ordinateur et mobile, navigation au clavier possible ;
- parcours testé manuellement (et par script pour les parcours critiques) ;
- code commité sur sa branche `feature/*`, fusionné dans `develop`.

# 3. Outil de gestion de projet

Le tableau Kanban est tenu dans **Notion** (base de données en vue « Tableau » groupée par statut, filtrable par sprint et par epic). Chaque carte contient : identifiant, user story, epic, sprint, priorité, estimation et branche Git associée. Le tableau est publié en lecture seule ; son lien figure dans la copie à rendre et dans le README.

Le backlog complet est également fourni au format CSV (`docs/backlog-gestion-projet.csv`), directement importable dans Notion, Trello ou Jira.

# 4. Planification des sprints

| Sprint | Stories | Charge | Epics |
|---|---|---|---|
| Sprint 0 | 4 | 6,5 h | Cadrage |
| Sprint 1 | 10 | 14,5 h | Front public, Socle |
| Sprint 2 | 10 | 13 h | Commande, Comptes, Espace client |
| Sprint 3 | 9 | 9,5 h | Administration, Espace employé |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sprint 4 | 4 | 5,5 h | Livraison, Qualité |

Chaque sprint se termine par une revue : démonstration des fonctionnalités, fusion de la branche dans `develop` et mise à jour du tableau.


# 5. Backlog produit

| ID | User story | Sprint | Priorité | Estim. |
|---|---|---|---|---|
| VG-01 | **Analyse du besoin et cahier des charges**<br>En tant que chef de projet, je veux un cahier des charges validé afin de cadrer le développement | Sprint 0 | Haute | 1,5 h |
| VG-02 | **Maquettes : wireframes et mockups**<br>En tant que client, je veux voir les maquettes desktop et mobile avant le développement | Sprint 0 | Haute | 2,5 h |
| VG-03 | **Charte graphique**<br>En tant que client, je veux une identité visuelle cohérente (couleurs, polices) | Sprint 0 | Moyenne | 1 h |
| VG-04 | **Modélisation MCD / MLD**<br>En tant que développeur, je veux un modèle de données validé avant de coder | Sprint 0 | Haute | 1,5 h |
| VG-05 | **Environnement Docker et dépôt Git**<br>En tant que développeur, je veux un environnement reproductible et un dépôt avec main/develop | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-06 | **Scripts SQL schema.sql et data.sql**<br>En tant que développeur, je veux créer la base et ses données de test par des scripts SQL | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-07 | **Socle MVC : routeur, PDO, session, CSRF**<br>En tant que développeur, je veux un socle sécurisé réutilisable | Sprint 1 | Haute | 2,5 h |
| VG-08 | **Page d'accueil et avis validés**<br>En tant que visiteur, je veux découvrir l'entreprise, son équipe et les avis clients | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-09 | **Menu de navigation et pied de page (horaires)**<br>En tant que visiteur, je veux naviguer facilement et voir les horaires du lundi au dimanche | Sprint 1 | Haute | 1 h |
| VG-10 | **Vue globale des menus**<br>En tant que visiteur, je veux voir tous les menus avec titre, description, minimum et prix | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-11 | **Filtres dynamiques des menus**<br>En tant que visiteur, je veux filtrer par prix, fourchette, thème, régime et nb de personnes sans recharger | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-12 | **Détail d'un menu**<br>En tant que visiteur, je veux voir la galerie, les plats, les allergènes et les conditions mises en évidence | Sprint 1 | Haute | 1,5 h |
| VG-13 | **Page contact**<br>En tant que visiteur, je veux contacter l'entreprise (titre, description, e-mail) | Sprint 1 | Moyenne | 1 h |
| VG-14 | **Mentions légales, CGV, confidentialité**<br>En tant que client, je veux connaître les conditions et l'usage de mes données (RGPD) | Sprint 1 | Moyenne | 1 h |
| VG-15 | **Création de compte**<br>En tant que visiteur, je veux créer un compte avec un mot de passe sécurisé et recevoir un e-mail de bienvenue | Sprint 2 | Haute | 1,5 h |
| VG-16 | **Connexion et anti force brute**<br>En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de façon sécurisée | Sprint 2 | Haute | 1,5 h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VG-17 | **Mot de passe oublié**<br>En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe via un lien reçu par e-mail | Sprint 2 | Haute | 1 h |
| VG-18 | **Commande d'un menu**<br>En tant qu'utilisateur, je veux commander un menu avec mes informations pré-remplies | Sprint 2 | Haute | 2,5 h |
| VG-19 | **Calcul du prix, remise et livraison**<br>En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail du prix (remise 10 %, livraison 5 € + 0,59 €/km) avant de valider | Sprint 2 | Haute | 1,5 h |
| VG-20 | **E-mail de confirmation de commande**<br>En tant qu'utilisateur, je veux recevoir la confirmation de ma commande | Sprint 2 | Haute | 0,5 h |
| VG-21 | **Espace utilisateur : commandes et suivi**<br>En tant qu'utilisateur, je veux voir mes commandes et leur suivi daté | Sprint 2 | Haute | 1,5 h |
| VG-22 | **Modifier / annuler sa commande**<br>En tant qu'utilisateur, je veux modifier ou annuler tant que la commande n'est pas acceptée | Sprint 2 | Haute | 1 h |
| VG-23 | **Donner un avis**<br>En tant qu'utilisateur, je veux noter (1 à 5) et commenter une commande terminée | Sprint 2 | Moyenne | 1 h |
| VG-24 | **Modifier mes informations / supprimer mon compte**<br>En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes données personnelles | Sprint 2 | Moyenne | 1 h |
| VG-25 | **Gestion des commandes (employé)**<br>En tant qu'employé, je veux filtrer les commandes par statut et client et changer leur statut | Sprint 3 | Haute | 1,5 h |
| VG-26 | **Retour de matériel et e-mails de statut**<br>En tant qu'employé, je veux que le client soit prévenu (600 € de frais, invitation à l'avis) | Sprint 3 | Haute | 1 h |
| VG-27 | **Annulation / modification après contact client**<br>En tant qu'employé, je dois indiquer le mode de contact et le motif | Sprint 3 | Haute | 1 h |
| VG-28 | **CRUD menus et galerie d'images**<br>En tant qu'employé, je veux créer, modifier, supprimer les menus et leurs images | Sprint 3 | Haute | 1,5 h |
| VG-29 | **CRUD plats et allergènes**<br>En tant qu'employé, je veux gérer les plats et leurs allergènes | Sprint 3 | Haute | 1 h |
| VG-30 | **Gestion des horaires**<br>En tant qu'employé, je veux modifier les horaires affichés | Sprint 3 | Moyenne | 0,5 h |
| VG-31 | **Modération des avis**<br>En tant qu'employé, je veux valider ou refuser les avis | Sprint 3 | Haute | 0,5 h |
| VG-32 | **Comptes employés**<br>En tant qu'administrateur, je veux créer et désactiver des comptes employés | Sprint 3 | Haute | 1 h |
| VG-33 | **Statistiques MongoDB**<br>En tant qu'administrateur, je veux comparer les commandes et le CA par menu (graphique, filtres) | Sprint 3 | Haute | 1,5 h |
| VG-34 | **Accessibilité et responsive**<br>En tant qu'utilisateur en situation de handicap, je veux un site conforme au RGAA | Sprint 4 | Haute | 1 h |
| VG-35 | **Tests des parcours**<br>En tant que chef de projet, je veux que tous les parcours soient testés | Sprint 4 | Haute | 1,5 h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VG-36 | **Déploiement**<br>En tant que client, je veux l'application en ligne et fonctionnelle | Sprint 4 | Haute | 1,5 h |
| VG-37 | **README et documentations PDF**<br>En tant que jury, je veux comprendre l'installation, l'usage et les choix techniques | Sprint 4 | Haute | 1,5 h |

## 6. Organisation du code source (Git)

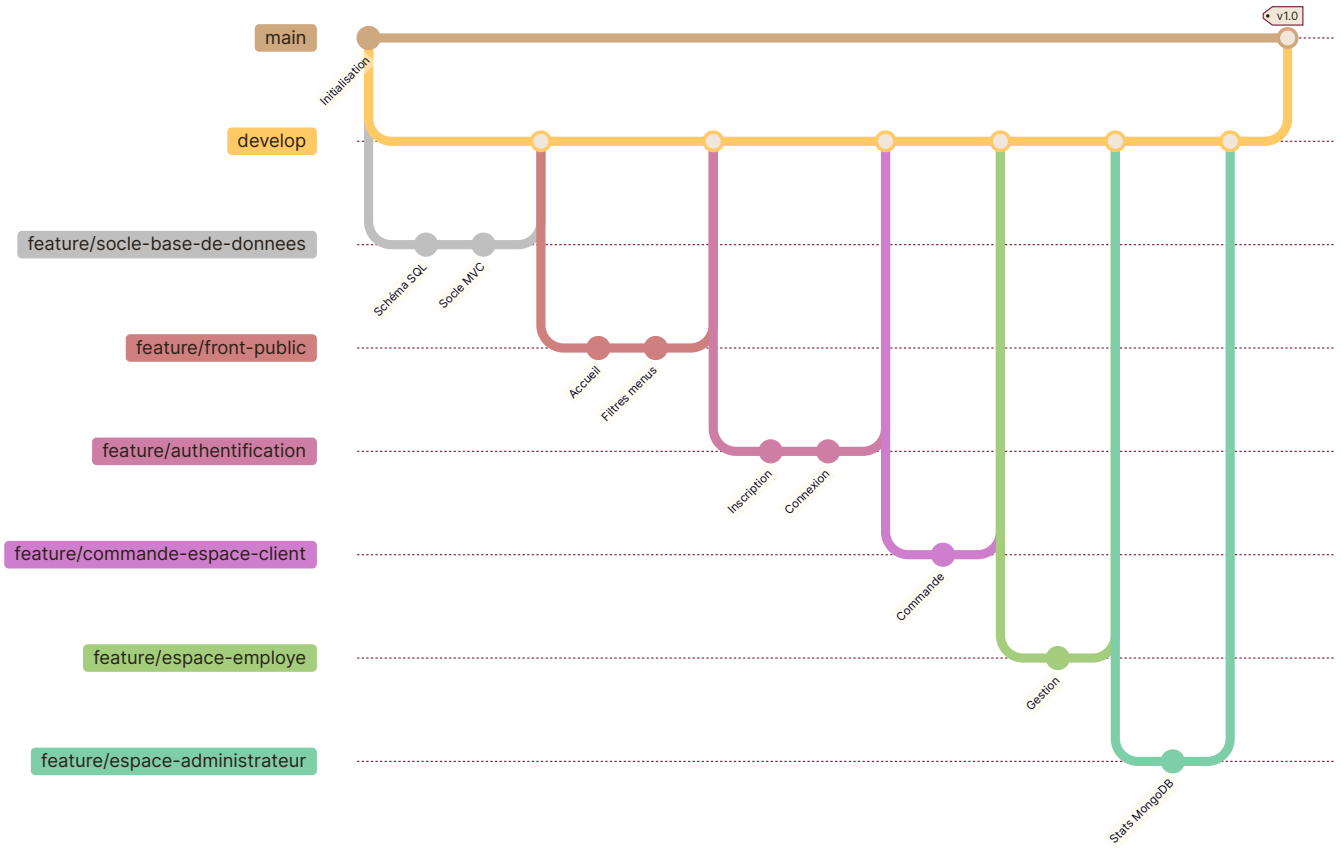


- `main` : branche stable, déployée automatiquement en production ;
- `develop` : branche d'intégration ;
- `feature/…` : une branche par fonctionnalité, créée depuis `develop`, fusionnée avec `--no-ff` après tests (l'historique garde la trace de chaque fonctionnalité) ; `fix/…` pour les corrections ;
- messages de commit en français, à l'impératif ou descriptifs, une modification logique par commit.

## 7. Suivi des risques

| Risque | Impact | Réponse |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Mauvaise compréhension du besoin (client non technicien) | Élevé | Maquettes validées en sprint 0, livraisons incrémentales |
| Application non en ligne à la livraison (pénalités) | Élevé | Conteneurisation Docker dès le sprint 1, déploiement testé avant la fin |
| Faille de sécurité | Élevé | Checklist OWASP appliquée à chaque story (Definition of Done) |
| Indisponibilité de MongoDB | Moyen | MySQL reste la source de vérité ; synchronisation rejouable |
| Dépassement du temps | Moyen | Priorisation : les stories « moyennes » peuvent être simplifiées |

## 8. Bilan

Les 37 user stories ont été réalisées. Le découpage en branches de fonctionnalité a permis de livrer et tester chaque partie indépendamment ; la priorisation a placé les exigences contractuelles (commande, statuts, statistiques NoSQL, déploiement) avant les améliorations de confort.
