

Gestion de projet

Méthode, outil, backlog, planification et organisation Git

ECF — Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile
Version 1.0 — octobre 2026
Auteur : Romain Frigolet (FastDev)

1. Contexte et organisation

Le projet est mené pour le compte de l'agence **FastDev**, sous la direction d'un chef de projet qui a recueilli les besoins de Julie et José (Vite & Gourmand). Je suis le développeur full-stack chargé de l'ensemble de la réalisation : analyse, maquettage, développement front-end et back-end, tests, déploiement et documentation. La durée indicative est de **70 heures**.

2. Méthode : agile Kanban en sprints courts

J'ai choisi une approche **agile** inspirée de Scrum et de Kanban, adaptée à un développeur seul :

- le besoin est découpé en **user stories** (« En tant que…, je veux…, afin de… ») regroupées par **epics** (cadrage, socle, front public, comptes, commande, espace client, espace employé, administration, qualité, livraison) ;
- chaque story reçoit une **priorité** (MoSCoW simplifié : haute / moyenne) et une **estimation** en heures ;
- le travail est planifié en **5 sprints** (sprint 0 de cadrage + 4 sprints de réalisation), chacun se terminant par une version testée fusionnée dans `develop` ;
- l'avancement est suivi sur un **tableau Kanban** à 4 colonnes : *À faire* → *En cours* → *En test* → *Terminé*, avec une limite d'une story « En cours » à la fois pour finir avant de commencer.

Pourquoi pas un cycle en V ? Le client n'a pas de culture informatique : livrer des incréments visibles (catalogue, puis commande, puis back-office) permet de valider au fil de l'eau et de réduire le risque de mauvaise interprétation du besoin.

2.1 Définition de « Terminé » (Definition of Done)

- Fonctionnalité conforme à la user story et aux règles de gestion de l'énoncé ;
- validation des données côté serveur, protections de sécurité en place (CSRF, échappement, contrôle d'accès) ;
- affichage vérifié sur ordinateur et mobile, navigation au clavier possible ;
- parcours testé manuellement (et par script pour les parcours critiques) ;
- code commité sur sa branche `feature/*`, intégré dans `develop` par une Pull Request validée (tests au vert).

3. Outil de gestion de projet

Le tableau Kanban est tenu dans **GitHub Projects**, relié au dépôt : github.com/users/Romainfrigolet/projects/1. Chaque user story est une *issue* du dépôt (titre préfixé par son sprint et son identifiant VG-xx) ; les colonnes Todo, In Progress et Done suivent son avancement, et une issue passée en Done est automatiquement fermée. Avoir les tâches dans le même outil que le code permet de relier chaque fonctionnalité à sa branche et à ses commits. Le tableau est public, en lecture seule.

Le backlog complet est également fourni au format CSV (`docs/backlog-gestion-projet.csv`), directement importable dans Notion, Trello ou Jira.

4. Planification des sprints

Sprint	Stories	Charge	Epics
Sprint 0	4	6,5 h	Cadrage
Sprint 1	10	14,5 h	Front public, Socle

Sprint 2	10	13 h	Commande, Comptes, Espace client
Sprint 3	9	9,5 h	Administration, Espace employé
Sprint 4	4	5,5 h	Livraison, Qualité

Chaque sprint se termine par une revue : démonstration des fonctionnalités, fusion de la branche dans `develop` et mise à jour du tableau.


5. Backlog produit

ID	User story	Sprint	Priorité	Estim.
VG-01	**Analyse du besoin et cahier des charges** En tant que chef de projet, je veux un cahier des charges validé afin de cadrer le développement	Sprint 0	Haute	1,5 h
VG-02	**Maquettes : wireframes et mockups** En tant que client, je veux voir les maquettes desktop et mobile avant le développement	Sprint 0	Haute	2,5 h
VG-03	**Charte graphique** En tant que client, je veux une identité visuelle cohérente (couleurs, polices)	Sprint 0	Moyenne	1 h
VG-04	**Modélisation MCD / MLD** En tant que développeur, je veux un modèle de données validé avant de coder	Sprint 0	Haute	1,5 h
VG-05	**Environnement Docker et dépôt Git** En tant que développeur, je veux un environnement reproductible et un dépôt avec main/develop	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-06	**Scripts SQL schema.sql et data.sql** En tant que développeur, je veux créer la base et ses données de test par des scripts SQL	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-07	**Socle MVC : routeur, PDO, session, CSRF** En tant que développeur, je veux un socle sécurisé réutilisable	Sprint 1	Haute	2,5 h
VG-08	**Page d'accueil et avis validés** En tant que visiteur, je veux découvrir l'entreprise, son équipe et les avis clients	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-09	**Menu de navigation et pied de page (horaires)** En tant que visiteur, je veux naviguer facilement et voir les horaires du lundi au dimanche	Sprint 1	Haute	1 h
VG-10	**Vue globale des menus** En tant que visiteur, je veux voir tous les menus avec titre, description, minimum et prix	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-11	**Filtres dynamiques des menus** En tant que visiteur, je veux filtrer par prix, fourchette, thème, régime et nb de personnes sans recharger	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-12	**Détail d'un menu** En tant que visiteur, je veux voir la galerie, les plats, les allergènes et les conditions mises en évidence	Sprint 1	Haute	1,5 h
VG-13	**Page contact** En tant que visiteur, je veux contacter l'entreprise (titre, description, e-mail)	Sprint 1	Moyenne	1 h
VG-14	**Mentions légales, CGV, confidentialité** En tant que client, je veux connaître les conditions et l'usage de mes données (RGPD)	Sprint 1	Moyenne	1 h
VG-15	**Création de compte** En tant que visiteur, je veux créer un compte avec un mot de passe sécurisé et recevoir un e-mail de bienvenue	Sprint 2	Haute	1,5 h
VG-16	**Connexion et anti force brute** En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de façon sécurisée	Sprint 2	Haute	1,5 h

VG-17	**Mot de passe oublié** En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe via un lien reçu par e-mail	Sprint 2	Haute	1 h
VG-18	**Commande d'un menu** En tant qu'utilisateur, je veux commander un menu avec mes informations pré-remplies	Sprint 2	Haute	2,5 h
VG-19	**Calcul du prix, remise et livraison** En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail du prix (remise 10 %, livraison 5 € + 0,59 €/km) avant de valider	Sprint 2	Haute	1,5 h
VG-20	**E-mail de confirmation de commande** En tant qu'utilisateur, je veux recevoir la confirmation de ma commande	Sprint 2	Haute	0,5 h
VG-21	**Espace utilisateur : commandes et suivi** En tant qu'utilisateur, je veux voir mes commandes et leur suivi daté	Sprint 2	Haute	1,5 h
VG-22	**Modifier / annuler sa commande** En tant qu'utilisateur, je veux modifier ou annuler tant que la commande n'est pas acceptée	Sprint 2	Haute	1 h
VG-23	**Donner un avis** En tant qu'utilisateur, je veux noter (1 à 5) et commenter une commande terminée	Sprint 2	Moyenne	1 h
VG-24	**Modifier mes informations / supprimer mon compte** En tant qu'utilisateur, je veux gérer mes données personnelles	Sprint 2	Moyenne	1 h
VG-25	**Gestion des commandes (employé)** En tant qu'employé, je veux filtrer les commandes par statut et client et changer leur statut	Sprint 3	Haute	1,5 h
VG-26	**Retour de matériel et e-mails de statut** En tant qu'employé, je veux que le client soit prévenu (600 € de frais, invitation à l'avis)	Sprint 3	Haute	1 h
VG-27	**Annulation / modification après contact client** En tant qu'employé, je dois indiquer le mode de contact et le motif	Sprint 3	Haute	1 h
VG-28	**CRUD menus et galerie d'images** En tant qu'employé, je veux créer, modifier, supprimer les menus et leurs images	Sprint 3	Haute	1,5 h
VG-29	**CRUD plats et allergènes** En tant qu'employé, je veux gérer les plats et leurs allergènes	Sprint 3	Haute	1 h
VG-30	**Gestion des horaires** En tant qu'employé, je veux modifier les horaires affichés	Sprint 3	Moyenne	0,5 h
VG-31	**Modération des avis** En tant qu'employé, je veux valider ou refuser les avis	Sprint 3	Haute	0,5 h
VG-32	**Comptes employés** En tant qu'administrateur, je veux créer et désactiver des comptes employés	Sprint 3	Haute	1 h
VG-33	**Statistiques MongoDB** En tant qu'administrateur, je veux comparer les commandes et le CA par menu (graphique, filtres)	Sprint 3	Haute	1,5 h
VG-34	**Accessibilité et responsive** En tant qu'utilisateur en situation de handicap, je veux un site conforme au RGAA	Sprint 4	Haute	1 h
VG-35	**Tests des parcours** En tant que chef de projet, je veux que tous les parcours soient testés	Sprint 4	Haute	1,5 h

VG-36	**Déploiement** En tant que client, je veux l'application en ligne et fonctionnelle	Sprint 4	Haute	1,5 h
VG-37	**README et documentations PDF** En tant que jury, je veux comprendre l'installation, l'usage et les choix techniques	Sprint 4	Haute	1,5 h

6. Organisation du code source (Git)

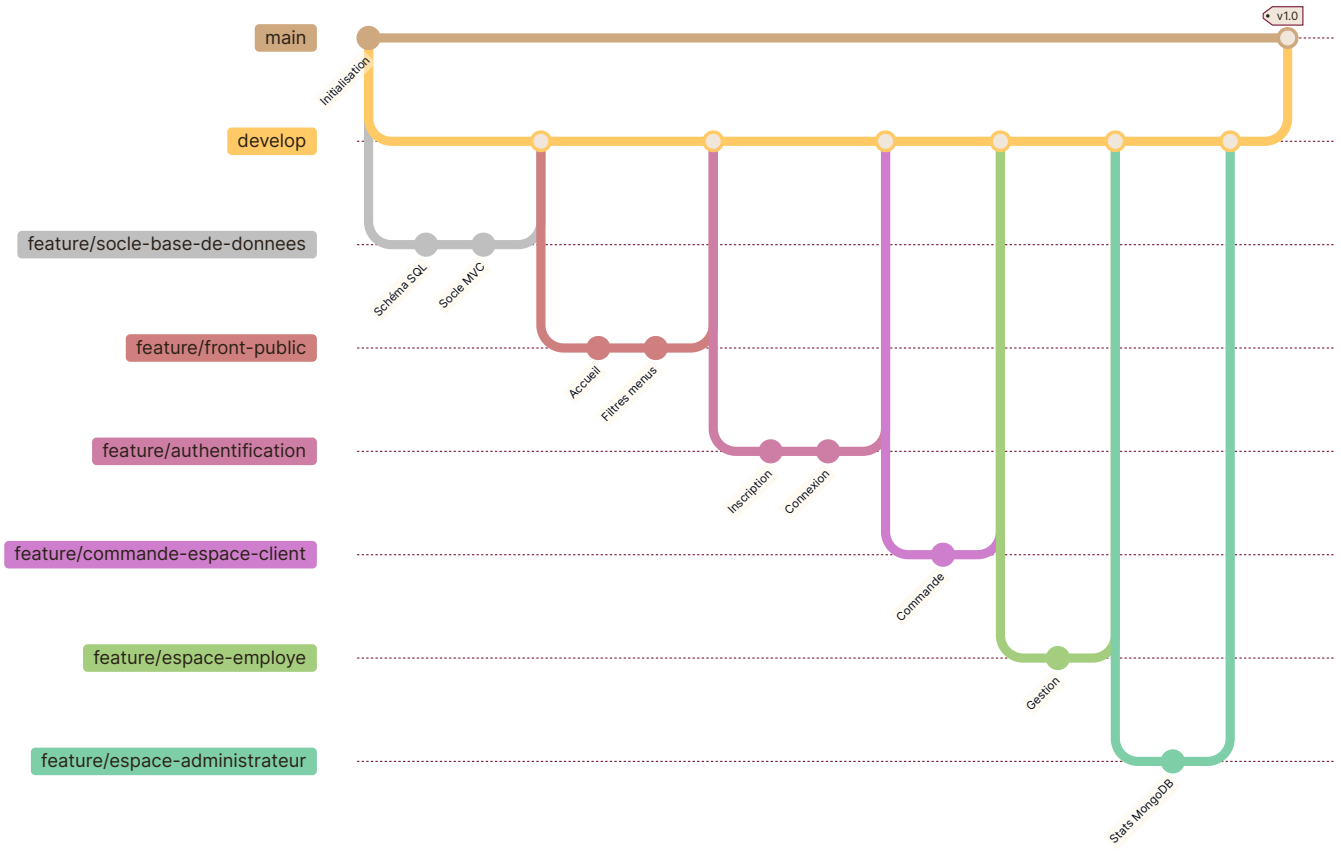

- `main` : branche stable, déployée automatiquement en production ;
- `develop` : branche d'intégration ;
- `feature/…` : une branche par fonctionnalité, créée depuis `develop`, fusionnée avec `--no-ff` après tests (l'historique garde la trace de chaque fonctionnalité) ; `fix/…` pour les corrections ;
- messages de commit en français, à l'impératif ou descriptifs, une modification logique par commit ;
- **Pull Requests** : toute intégration passe par une PR sur GitHub (`feature/*` ou `fix/*` → `develop`, puis `develop` → `main` pour une mise en production). La PR suit le modèle `.github/pull_request_template.md` (objet, lien vers l'issue, type de modification, liste de vérifications) ; elle n'est fusionnée que lorsque les tests automatiques GitHub Actions sont au vert, ce qui garde une trace de la validation de chaque modification.

7. Suivi des risques

Risque	Impact	Réponse
Mauvaise compréhension du besoin (client non technicien)	Élevé	Maquettes validées en sprint 0, livraisons incrémentales
Application non en ligne à la livraison (pénalités)	Élevé	Conteneurisation Docker dès le sprint 1, déploiement testé avant la fin
Faille de sécurité	Élevé	Checklist OWASP appliquée à chaque story (Definition of Done)
Indisponibilité de MongoDB	Moyen	MySQL reste la source de vérité ; synchronisation rejouable
Dépassement du temps	Moyen	Priorisation : les stories « moyennes » peuvent être simplifiées

8. Bilan

Les 37 user stories ont été réalisées. Le découpage en branches de fonctionnalité a permis de livrer et tester chaque partie indépendamment ; la priorisation a placé les exigences contractuelles (commande, statuts, statistiques NoSQL, déploiement) avant les améliorations de confort.
